Съфинансирано от Европейския съюз

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027
за развитие на земеделието и селските райони

МИГ Медковец - Монтана

Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ – 29.10.2026 г.

Успешно изпълнение на проекти

От договора до устойчивия резултат

Обучение за потенциални и бъдещи бенефициенти

Възложител

СНЦ „Местна инициативна група – Медковец - Монтана“

Изпълнител

„Грантит“ ЕООД

Място на провеждане - с. Смоляновци / зала на кметството



Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Grant it
EU Projects and Management

ВЪВЕДЕНИЕ ·

Цели на обучението

Организиране на изпълнението

Екип, отговорности, график, контролни точки

Правилен избор на ред за възлагане

ЗОП или ЗУСЕФСУ и ПМС № 4/2024 г.

Подготовка на документация

Спецификации, изисквания, критерии, методика

Управление на договорите

Контрол, приемане, плащания, изменения

Предотвратяване на нередности

Превенция преди решението, а не след него

Приключване и устойчивост

Отчитане, досие, поддържане на резултатите

Резултат

Изпълнени дейности и постигнати цели

Законосъобразност

Правилен ред и спазени условия

Доказателства

Пълно и проследимо досие

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

ВЪВЕДЕНИЕ ·

Програма на обучението

Модул 1	СВОМР и организация на изпълнението	Модул 5	Технически спецификации и критерии
Модул 2	Определяне на приложимия ред	Модул 6	Управление и изменение на договорите
Модул 3	Избор на изпълнители по ЗОП	Модул 7	Нередности, корекции и проверки
Модул 4	Избор с публична покана по ПМС № 4/2024 г.	Модул 8	Приключване и устойчивост

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

СВОМР НА МИГ МЕДКОВЕЦ–МОНТАНА · РЕЗЮМЕ

Стратегията накратко: 11 мерки за развитие на територията

6 мерки по ЕЗФРСР

≈ 2 297 620 €

Мерки 1–6

5 мерки с допълващо финансиране

≈ 836 678 € *

Мерки от· ПРЧР · „Образование“ · „Околна среда“

** Сборът на бюджетите е приблизителен след превалутирането*

Основни направления

- Земеделие
- Местен бизнес
- Инфраструктура и интелигентни селища
- Културно наследство
- Заетост
- Образование
- Околна среда

Три различни стойности — не са едно и също

1 Бюджет на мярката

Общият ресурс за всички проекти по мярката

2 Мин. и макс. допустими разходи

Рамката за размера на един проект

3 Максимална БФП

Най-голямата безвъзмездна помощ за един проект

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

ВЪВЕДЕНИЕ ·

Пътят на проекта след подписване на договора



Договор за финансиране | **Организация и планиране** | **Избор на изпълнители** | **Управление на изпълнението** | **Контрол и отчитане** | **Устойчивост**

Три въпроса, които ще ни водят през деня

1 Какво сме поели?
Задълженията по договора за финансиране

2 По кой ред?
Законосъобразен избор на изпълнител

3 Как ще докажем?
Документирано изпълнение и приемане

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 1 · СВОМР И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ·

СВОМР на МИГ Медковец–Монтана

Местни приоритети и мерки

Какви потребности, чрез кои мерки, при какви условия

Допустими кандидати

Различни по всяка мярка

Видове проектни дейности

Определени от мярката и процедурата

Връзка между стратегия, процедура и договор

Стратегията ориентира, процедурата определя, договорът задължава

Примери от СВОМР — допустими кандидати

Мярка	Допустими кандидати
Мярка 3 — основни услуги, дребна инфраструктура и интелигентни селища	Община Медковец и Община Монтана
Мярка 4 — културно и природно наследство и съпътстващи туристически дейности	Юридически лица с нестопанска цел и читалища — при съответните условия

Допустим кандидат по СВОМР ≠ отговор на въпроса по какъв ред се избира изпълнител.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Кандидат, бенефициент и възложител

Допустим кандидат

Може да кандидатства по конкретната мярка и процедура

Може ли да получи финансиране?

Бенефициент по договор

Подписал е договор за финансиране и носи задълженията по него

Какво е поел?

Възложител по ЗОП/ПМС

Има качеството на възложител по закона и прилага ЗОП и ППЗОП, ПМС № 4/2024

По какъв ред възлага?

Защо понятията не са равнозначни?

Читалище може да е допустим кандидат по мярка, но дали е възложител по ЗОП, се установява след отделна проверка на законовите предпоставки.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Договорът за финансиране — отправна точка

Договор за финансиране

- Одобрени дейности
- Бюджет
- Срокове
- Индикатори
- Приложения и задължения

Договорът става работен план

1. Какво трябва да направим?
2. До кога?
3. С какъв ресурс?
4. Кой отговаря?
5. Как ще докажем изпълнението?

Сума в бюджета ≠ свободно разполагаеми средства — спазваме одобреното предназначение.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Организация на проектното изпълнение

- **Проектен екип**
- **Разпределение на отговорности**
- **График**
- **План за избор на изпълнители**
- **Вътрешен контрол**

Четири практически инструмента

Календар на проекта

Срокове, междинни етапи, крайни дати

Матрица на отговорностите

Кой подготвя, проверява, одобрява, съхранява

Регистър на договорите

Изпълнители, стойности, срокове, плащания

Регистър на рисковете

Вероятност, последици, превантивни действия

Контролни точки: преди публикуване на документацията и преди всяко плащане — не едва накрая.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 1 · СВОМР И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ·

Първите 30 дни след договора

Стъпка 1	Стъпка 2	Стъпка 3	Стъпка 4	Стъпка 5
Преглед на договорните условия Договор, приложения, бюджет, индикатори	**Определяне на отговорници** Екип и матрица на отговорностите	**Планиране на възлаганията** Предмет, стойност, приложим ред	**Проверка на сроковете** Етапи, зависимости, крайни дати	**Регистър на основните рискове** Вероятност, последици, превенция

Пример за зависимости

Закъсняла доставка → **Забавено обучение** → **Услугата не започва** → **Риск за индикаторите**

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Защо правилният ред е решаващ?

Различни правни режими

ЗОП и ППЗОП или ЗУСЕФСУ и ПМС № 4/2024 г.

Различни задължения

Различни процедурни изисквания и документи

Различни електронни системи

ЦАИС ЕОП или „Е-тръжни процедури“ в ИСУН

Риск от финансови последици

Грешката в реда не се поправя с добре проведена процедура

Последователността, която ще ни води

Кой възлага? → Какво възлага? → Каква стойност? → Кой нормативен ред? → Коя система?

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Кой е възложител по ЗОП?

Публични възложители

Държавни и общински органи; публичноправни организации при законовите предпоставки

Други категории възложители

Секторни възложители и специални основания по закона

Общини и публичноправни организации

Общините Медковец и Монтана прилагат ЗОП

Проверка на правния статут

Цялостна преценка по законовите критерии

Какво се преценява?

- Обстоятелства за създаване
- Цели на организацията
- Начин на финансиране
- Контрол върху управлението
- Останалите законови критерии

Общинска субсидия или европейска безвъзмездна помощ сами по себе си не доказват автоматично качество на публичноправна организация.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Особености при различните бенефициенти

Общини

Публични възложители — прилагат ЗОП и ППЗОП

ЗОП

Читалища

Специална правна форма — статутът по ЗОП се проверява

Проверка

Сдружения

Правната форма не е достатъчна — цялостна преценка

Проверка

Предприятия

Ако не са възложители — проверка на условията по ЗУСЕФСУ и ПМС № 4

ПМС № 4?

Защо правната форма сама по себе си невинаги е достатъчна?

Законовите критерии изискват цялостна преценка — две сходни на пръв поглед организации могат да попадат в различен режим.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Кога се прилагаме ЗОП и кога ПМС № 4/2024 г.?



1. Бенефициент, който не е възложител по ЗОП
2. Проверка на предпоставките по ЗУСЕФСУ
3. Предмет и стойност на възлагането
4. Проверка на условията на процедурата

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Предмет и прогнозна стойност

Какво ще се възлага?
Действителната потребност и предметът

Доставка, услуга или строителство
Видът на предмета влияе върху правилата

Определяне на прогнозната стойност
Без ДДС, обосновано и документирано

Приложими прагове
По действащата редакция — сверяват се

Недопустимо разделяне
Не разделяме предмета, за да заобиколим реда

Доставка

Услуга

Строителство

Изкуствено разделяне на една обоснована потребност, за да се избегне определен ред — сериозен риск.

Сумата в бюджета не замества правилното определяне на предмета, прогнозната стойност и приложимия ред.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

ЦАИС ЕОП и ИСУН — две различни системи

ЗОП → ЦАИС ЕОП Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“		≠	ПМС № 4 → ИСУН „Е-тръжни процедури“ Модул „Електронни тръжни процедури“	
Предназначение на ЦАИС ЕОП	Възлагане на обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП		**Предназначение на ИСУН**	Публична покана по ЗУСЕФСУ и ПМС № 4/2024 г.
Електронни действия	Обявяване, документация, оферти, работа на комисията, актове		**Електронни действия**	Публикуване, разяснения, електронно подаване на оферти; служебно — на Единния информационен портал
Документална проследимост	Досие на поръчката в системата		**Документална проследимост**	Документиране на процедурата в ИСУН

Една система не замества другата — нито за публикуване, нито за подаване на оферти.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Основни етапи на възлагането по ЗОП

Планиране	Подготовка	Откриване	Подаване на оферти	Оценяване	Избор и договор
Потребност, предмет, стойност, ред	Документация и вътрешно одобряване	Обявяване или публикуване	Електронно, в ЦАИС ЕОП	По обявените условия	Решение, уведомяване, договор

Обща логика — не еднакви екрани и срокове за всички поръчки

Конкретните действия се проверяват по закона и по актуалните функционалности на ЦАИС ЕОП.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 3 · ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ЗОП ·

Планиране на обществената поръчка

1. **Определяне на потребността**
   Какво реално е необходимо за проекта?
2. **Предмет на поръчката**
   Доставка, услуга или строителство
3. **Прогнозна стойност**
   Обоснована и документирана
4. **Приложим ред**
   Съгласно действащата нормативна уредба
5. **График**
   План и срокове, съгласувани с проекта

Учебен пример: община, оборудване на обществена услуга

- ✗ Не разделяме еднородни доставки на изкуствено малки договори.
- ✗ Не обединяваме механично различни потребности без основание.
- ✓ Решението се основава на предмета, обстоятелствата и закона.

Защо не е достатъчно да знаем само сумата в проектния бюджет?

Бюджетната позиция не замества предмета, прогнозната стойност и приложимия ред.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 3 · ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ЗОП ·

Подготовка на документацията

Техническа спецификация

Функции и измерими характеристики

Изисквания към участниците

Относими и пропорционални

Критерий за възлагане

Цена, разходи или качество/цена

Методика за оценка

Ясно как се сравняват офертите

Проект на договор

Изпълнение, приемане, плащане

Контролни въпроси преди публикуване

1. Описана ли е реалната потребност?
2. Съответстват ли изискванията на предмета?
3. Има ли необосновано ограничение?
4. Ясни ли са критериите?
5. Съгласувани ли са условията на договора с графика?

За обсъждане

„Изпълнителят трябва да има офис на територията на общината.“

Защо е ограничително? Как да опишем реалната нужда от време за реакция или обслужване?

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 3 · ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ЗОП ·

Електронно възлагане чрез ЦАИС ЕОП

Откриване и публикуване	Съответното обявяване след вътрешно одобряване
Достъп до документацията	Електронен достъп за заинтересованите лица
Разяснения	Въпроси и отговори, когато са приложими
Подаване на оферти	Електронно, в платформата
Електронна проследимост	Следа на всяко действие и решение

ЦАИС ЕОП

Средата за съответните действия по ЗОП. ИСУН има друга функция — една система не замества другата.

Въпрос

Оферта, получена на обикновен имейл — подадена ли е по правилния електронен ред?

Определя се от процедурата, не се предполага.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Разглеждане, оценяване и избор

Проверка на офертите → **Прилагане на обявените правила** → **Оценяване** → **Класиране** → **Определяне на изпълнител**

Недопустимо след получаване на офертите

- Промяна на критериите, за да се предпочете участник
- Решения извън предварително обявените условия

Проследимост и мотиви

- Какво е проверено
- Какви несъответствия са установени
- Как е приложена методиката
- Кой е участвал в решението
- Как е документиран резултатът
- Конфликт на интереси
- Основания за отстраняване
- Уведомяване
- Сключване на договор

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Договор и досие на обществената поръчка

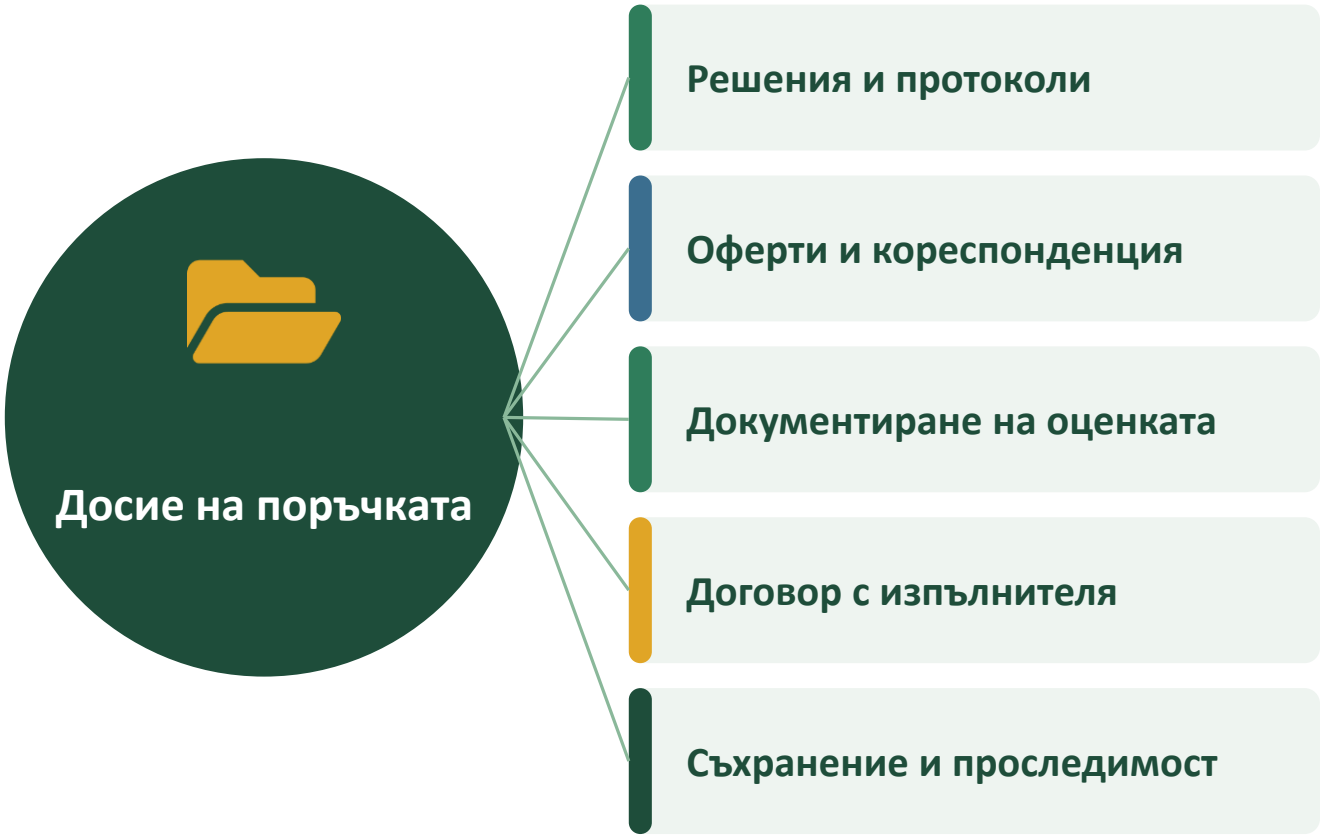

Примерен организационен списък

- Решение за откриване или публикуване
- Обявления и документация
- Разяснения
- Оферти и системна следа
- Разглеждане и оценяване
- Актове и уведомления
- Договор и приложения
- Последващо изпълнение

Точният комплект зависи от конкретния вид процедура.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 4 · ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 4/2024 Г. ·

Кога се използва публична покана?

Статут на бенефициента

Установено е, че не е възложител по ЗОП

Приложим правен режим

Глава четвърта ЗУСЕФСУ и ПМС № 4/2024 г.

Предмет и стойност

Прогнозна стойност и дял на помощта

Проверка на предпоставките

Допустимост по проекта и специални изисквания

Пет проверки преди поканата

1. Наистина ли не е възложител по ЗОП?
2. Попада ли финансирането в приложното поле?
3. Какви са предметът и прогнозната стойност?
4. Какъв е делът на помощта; има ли специални изисквания?
5. Предвидено и допустимо ли е по проекта?

Правилно изготвена публична покана не поправя грешка при определяне на приложимия ред.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 4 · ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 4/2024 Г. ·

Подготовка на публичната покана

Елемент	Какво проверява бенефициентът
Предмет на възлагането	Съответства ли на одобрения проект и реалната потребност?
Технически изисквания	Ясни и измерими ли са; не ограничават ли необосновано конкуренцията?
Условия за участие	Относими и пропорционални ли са?
Критерии и методика	Предварително обявени ли са; позволяват ли обективно сравнение?
Проект на договор	Ясни ли са условията за изпълнение, приемане, плащане и отговорност?

Правилната последователност

✕ Предпочитан доставчик → изисквания „по мярка“

✓ **Реална потребност → обективни изисквания**

Цел: ефективна конкуренция между подходящи предложения — не формално голям брой оферти.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 4 · ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 4/2024 Г. ·

Публикуване и електронна комуникация

Съответна функционалност в ИСУН
Модул „Електронни тръжни процедури“

Публикуване на документацията
В ИСУН - секция „Е-тръжни процедури“

Разяснения
Публикуват се по установения ред

Изменения при допустимост
Само при строго определени условия

Проследяване на сроковете
Реална възможност за подготовка на оферти

Други канали за разгласяване не заместват задължителното публикуване в ИСУН.

Съществена промяна в поканата

Ако промяната налага кандидатите да променят офертите си:

Прекратяване → **Ново обявяване**

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 4 · ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 4/2024 Г. ·

Подаване и разглеждане на офертите

1

Електронно подаване

В ИСУН, до крайния срок

2

Проверка на постъпилите оферти

След изтичане на срока

3

Прилагане на обявените изисквания

Без нови условия

4

Документиране на действията

Следа за последващ контрол

Не по електронна поща

„Изпратете офертата на нашия имейл“ не е правилно, когато редът изисква подаване чрез ИСУН.

Само една оферта?

Не е автоматично нарушение. Проверяваме: публично обявяване · неограничителни условия · съответствие с изискванията.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 4 · ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 4/2024 Г. ·

Оценяване и избор на изпълнител

1. **Обективни критерии**
2. **Прилагане на методиката**
3. **Документиране на оценката**
4. **Определяне на изпълнител**
5. **Сключване на договор**

Контролен въпрос	Защо е важен
Оценителите определени ли са по приложимия ред?	Законосъобразен състав и проследимост
Проверени ли са обстоятелствата за безпристрастност?	Предотвратяване на конфликт на интереси
Прилагат ли се само предварително обявените критерии?	Равнопоставеност на кандидатите
Мотивирани и документирани ли са оценките?	Възможност за последващ контрол
Спазен ли е редът за определяне на изпълнител?	Законосъобразно приключване

Нечетен брой оценители + резервни · протокол за утвърждаване. Без нови показатели и тежести след срока.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 4 · ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 4/2024 Г. ·

Чести рискове при публичната покана

Неправилен ред

Покана без проверен статут и предпоставки

Ограничителни условия

Марка или модел без основание; изисквания „по мярка“

Неясна методика

Нови показатели или тежести след срока

Пропуски в сроковете

Нереален срок; съществена промяна без ново обявяване

Непълна документация

Липсват версии, разяснения, протокол

Най-опасните грешки често не са в самата доставка, а в начина, по който е организиран изборът. Проверяваме преди публикуване.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 5 · ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ ·

Защо техническата спецификация е толкова важна?

Ясно описание на потребността

Какъв резултат очаква бенефициентът

Измерими характеристики

Сравними оферти

Проверим резултат

Изпълнението може да бъде прието

Равнопоставеност

Без необосновано предимство

Твърде тясно

Изисквания, които без обективна причина съответстват само на един производител → ограничена конкуренция

Правилният баланс

реална потребност · достатъчна конкуренция · проверими условия

Твърде общо

Оферти, които формално отговарят на условията, но не вършат необходимата работа

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Как формулираме технически изисквания?

Функционални характеристики

Количества

Качество

Срокове

Приемане на изпълнението

РИСКОВА ФОРМУЛИРОВКА

„Да се достави компютър марка X, модел Y, с точно определен търговски продуктов код.“

ПО-ПОДХОДЯЩ ПОДХОД

Минимални функционални характеристики, съвместимост със съществуващата среда, условия за гаранционно обслужване.

Пет проверки преди публикуване

- ✓ Необходимост
- ✓ Яснота
- ✓ Измеримост
- ✓ Пропорционалност
- ✓ Конкуренция

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Три различни групи изисквания

Какво купуваме?	*Кой може да участва?*	*Как избираме офертата?*
Технически спецификации	**Критерии за подбор**	**Критерии за възлагане**
Характеристики на предмета	Възможности на кандидата	Сравняване на допустимите оферти
Пример: определена гаранция на оборудването	*Пример: професионален опит*	*Пример: цена или качество/цена*

Защо не трябва да се смесват?

Свързани са, но не са взаимозаменяеми — проверяват се по различен начин и на различен етап.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 5 · ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ ·

Критерии за възлагане и методика

Най-ниска цена

Стандартна доставка с ясно описани характеристики

Ниво на разходите

Според възможностите на приложимия режим

Оптимално съотношение качество/цена

Когато качеството е съществено

Примерна учебна методика

Показател	Точки	Какво трябва да е ясно
Цена	60	Точната формула за изчисляване
Качество на решението	40	Конкретни, проверими подпоказатели
Общо	**100**	Еднакво приложение към всички

Ясни показатели: двама независими оценители достигат до съпоставима оценка.

Прозрачно оценяване: показателите се обявяват предварително и не се променят след офертите.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Ограничителни и неясни условия

Риск	Пример от материала	По-добър подход
Необосновано конкретизиране	Марка, модел или търговски код без основание	Функционални характеристики
Непропорционални изисквания	10 идентични договора за година при стандартна доставка	Опит, съразмерен на сложността
Неясни показатели	„Добро техническо предложение — до 50 точки“	Конкретни, проверими подпоказатели
Субективна оценка	Широка свобода на преценка на оценителите	Правила за съпоставима оценка
Риск от ограничаване на конкуренцията	Офис или регистрация в конкретна община	Реалната нужда — напр. време за реакция

Местна полза

Постига се чрез резултата от проекта, а не чрез необосновано ограничаване на кандидатите.

Проект в община Медковец → автоматично изискване доставчикът да е регистриран там?

Не.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 6 · УПРАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ·

Какво започва след подписването на договора?

От избора на изпълнител до приключването на договора

Избор на изпълнител → **Договор** → **Изпълнение и контрол** → **Приемане** → **Плащане** → **Приключване на договора**

Организация на изпълнението
Договорът — инструмент за управление

Отговорници
Комуникация, график, техническа проверка,

Срокове
Начало, междинни етапи, краен срок

Контролни точки
Своевременно откриване на проблеми

Комуникация
Документирана кореспонденция с изпълнителя

Кой отговаря пред финансиращия орган, ако доставчикът не изпълни? Бенефициентът — и трябва да докаже упражнения контрол.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 6 · УПРАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ·

Контрол на изпълнението

- **Количества**
- **Качество**
- **Срокове**
- **Договорени резултати**
- **Документиране**

Доставка

Количество, характеристики, комплектност, гаранция, монтаж

Услуга

Задачи, качество на резултата, срокове, отчети

Строителство

Видове и количества работи, съответствие с проекта

Учебен пример: доставка за 28 000 евро без ДДС, срок 60 дни — контролни точки

Потвърждение на графика → Проверка на готовността → Проверка при получаване

Фактурата ≠ доказателство за реално изпълнение. Необходими са и доказателства за действително изпълненото.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 6 · УПРАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ·

Приемане на изпълнението и плащания

1. **Проверка на доставката или услугата**
2. **Приемателни документи**
3. **Фактуриране**
4. **Проверка преди плащане**
5. **Документална следа**

Учебен пример

10 договорени устройства — 2 не отговарят на изискванията.

Не: пълно и безусловно приемане. Да: документиране на несъответствието и договорните механизми — отстраняване, замяна, отказ от приемане на частта.

Преди плащане проверяваме

- Доказателства за действително изпълнение
- Съответствие с договора
- Подписани приемателни документи
- Настъпили договорни предпоставки за плащане
- Фактура, количества и суми = прието изпълнение
- Условията на договора за финансиране

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Изменение на договора с изпълнителя

Причина за изменението
Какво точно се променя и защо?

Договорни условия
Предвидено ли е в договора и документацията?

Приложими правни основания
Според реда, по който е избран изпълнителят

Необходими документи
Доказателства за причината и обосновка

Допустимост на промяната
Влияние върху конкуренцията, стойността и характера

Договор след ЗОП

Преценка по чл. 116 ЗОП и останалите приложими правила

≠

Договор след ПМС № 4

Съответният режим за тези договори и условията на финансирането

„И двете страни сме съгласни“ не е правно основание за анекс.

Никога не започваме от анекса — започваме от проверката дали той е допустим.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Два договора — различни задължения

Договор за финансиране

Бенефициент ↔ финансиращ орган

- Одобрени дейности
- Бюджет и срокове
- Индикатори
- Отчетност

≠

Договор с изпълнител

Бенефициент ↔ изпълнител

- Предмет и цена
- Срокове и качество
- Приемане
- Плащане

Промяна по единия договор → **Възможно отражение върху другия** → **Необходимост от отделни проверки**

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Какво представлява нередността?

Нарушение на приложими правила

Не всяка техническа грешка е нередност

Възможни финансови последици

Действителна или потенциална вреда за бюджета на ЕС

Рискови действия

Избор на изпълнител, изменения, приемане, плащания

Значение на превенцията

Контрол преди решението

Понятие	Практически смисъл
Нарушение	Несъответствие с приложимо изискване
Нередност	Нарушение, което изпълнява законовите предпоставки за нередност
Финансова корекция	Определена по приложимия ред финансова последица
Недопустим разход	Не отговаря на условията за финансиране; последицата се преценява отделно

Оборудването работи отлично — доказва ли това законосъобразен избор?

Не. Качеството на доставката и законосъобразността на избора са различни въпроси.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Най-чести нарушения при избор на изпълнител

Рискова ситуация	Превантивно действие
Неправилно определен ред	Писмена проверка на статута, предмета и стойността
Недопустимо разделяне	Обосновано планиране на потребностите
Ограничителни изисквания	Техническа и правна проверка; относимост и пропорционалност
Неправилно оценяване	Обявените критерии, проверима методика, мотивиран протокол
Неправомерно изменение	Проверка на правното основание преди анекс

И при изпълнението

- **Изменение без правно основание**
- **Приемане на несъответстващо изпълнение**
- **Плащане без доказателства**
- **Неспазени условия на финансирането**

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Конфликт на интереси и свързаност

1

Разпознаване на рискови ситуации

Отношения с кандидат или изпълнител

2

Безпристрастност

Независимост на оценяването

3

Деклариране и проверка

Декларация + проверка на обстоятелствата

4

Документиране на предприетите действия

Проследима преценка

Не всяко познанство е автоматично конфликт на интереси

Всяко относимо обстоятелство се разглежда по приложимите правила.

Подписаната декларация не приключва въпроса

Когато има данни, които налагат допълнителна проверка.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 7 · НЕРЕДНОСТИ, КОРЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ ·

Финансови корекции — как възниква рискът?

Установено нарушение → **Приложими правила** → **Финансово отражение**

Размерът не следва автоматично от наименованието на грешката

Финансовата корекция изисква

- **Установено нарушение**
- **Правно основание**
- **Съответна процедура**
- **Мотивирана преценка**

Значение на доказателствата

Проследимото досие показва основанието на всяко решение.

Превантивни проверки

Преди публикуване, избор, изменение и плащане.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 7 · НЕРЕДНОСТИ, КОРЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ ·

Подготовка за документална проверка и проверка на място

- **Договорна документация**
- **Процедури за избор**
- **Договори с изпълнители**
- **Приемане и плащания**
- **Кореспонденция**
- **Проследимост**

Подготовката не започва в деня на уведомлението — досието се поддържа текущо.

Документална проверка

Документи ↔ правила, договор, отчетени разходи

Проверка на място

Активи, дейности, използване по предназначение

Последваща проверка

Запазени документи и продължаващи задължения

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Съфинансирано от Европейския съюз
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027 за развитие на земеделието и селските райони
МИГ Медковец - Монтана
Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони

БОНУС · ТЕМА 4 · ПРИЛОЖЕНИЕ НА AI

AI при изпълнението на проекти и избора на изпълнители

МОДУЛ 1 · ДОГОВОР

Карта на задълженията

Извлича от договора за финансиране сроковете, задълженията и индикаторите в таблица.

Проверявате: всеки ред спрямо текста на договора

МОДУЛ 3–4 · ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чернови на документи

Подготвя структура и чернови на покана, документация и проект на договор по ваш образец.

Проверявате: съответствие с приложимия ред

МОДУЛ 5 · СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проверка за ограничения

Открива конкретни марки, местни изисквания и непропорционален опит в спецификацията.

Проверявате: правната и техническата преценка

МОДУЛ 5 · МЕТОДИКА

Яснота на методиката

Посочва показатели без ясни правила, при които двама оценители биха оценили различно.

Проверявате: окончателната методика — от екипа

МОДУЛ 6 · ДОГОВОРИ

Регистри и контрол

Поддържа регистър на договорите, сроковете и плащанията; напомня за контролни точки.

Проверявате: данните спрямо документите

МОДУЛ 7–8 · ДОСИЕ

Подготовка за проверка

Сверява описа на досието с контролния списък и посочва липсващи документи.

Проверявате: наличието на оригиналните документи

AI проверява и подрежда — правната преценка, изборът на изпълнител и подписите остават на отговорните лица.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

БОНУС · ТЕМА 4 · ПРИЛОЖЕНИЕ НА AI

AI при изпълнението на проекти — как да питаме и какво не правим

Примерни заявки към AI асистент (учебни)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Ето проект на техническа спецификация. Открий изисквания, които сочат конкретна марка или модел, изискват местоположение на изпълнителя или опит, непропорционален на предмета. Цитирай точно формулировката.“

Резултат: списък с рискови формулировки за преглед

ДОГОВОР

„Извлечи от договора за финансиране всички срокове, задължения за уведомяване и отчетност в таблица: задължение, срок, точка от договора.“

Резултат: проверима карта на задълженията

МЕТОДИКА

„Ето методиката за оценка. Посочи показатели, при които двама независими оценители биха могли да дадат различни точки за една и съща оферта.“

Резултат: неясни показатели за преработване

Граници и правила

- **Не определя приложимия ред.** ЗОП или ПМС № 4 — правна преценка.
- **Не цитира закона без проверка.** Членове, прагове и срокове — от официалния текст.
- **Без оферти и лични данни** в публични AI инструменти.
- **Не оценява офертите.** Решението и мотивите са на оценителите.
- **Документира се.** Окончателните документи са проверени и подписани от отговорните лица.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 8 · ПРИКЛЮЧВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ·

Подготовка за окончателно приключване

Фактическо приключване
Дейности, доставки, услуги и резултати

Финансово-административно
Документирани разходи, отчети, искания за плащане

Последващи задължения
Документи, активи, устойчивост, проверки

Финална вътрешна проверка

Проверка на дейностите → **Постигнати резултати** → **Индикатори** → **Приключване на договорите** → **Окончателно отчитане**

ИСУН — две различни употреби: публична покана по ПМС № 4 ≠ отчитане на финансирания проект.

Отклоненията не се прикриват — проверява се допустимост, съгласуване и отразяване.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МОДУЛ 8 · ПРИКЛЮЧВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ·

Проектно досие и последващи задължения

Подреждане на документите
По дейности, договори и разходи

Съхранение
Срокове според приложимата рамка

Последващи проверки
Лице, което следи кореспонденцията

Използване на активите
По предназначение и с отговорник

Поддържане на резултатите
Устойчивост след последното плащане

Четири измерения на устойчивостта

Функционална
Използва ли се по предназначение?

Финансова
Средства за поддръжка и текущи разходи?

Организационна
Кой отговаря след проекта?

Обществена
Отговаря ли на реална местна потребност?

Срокът за устойчивост не е универсален — определя се от конкретното финансиране.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ·

Десет проверки преди избор на изпълнител

01 Статут на бенефициента

02 Приложим ред

03 Предмет

04 Прогнозна стойност

05 Планиране

06 Техническа спецификация

07 Критерии за подбор

08 Методика за оценка

09 Документация и срокове

10 Вътрешен контрол

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ·

Пет правила за успешно изпълнение

1. **Познавайте договора за финансиране**
2. **Избирайте правилния ред за възлагане**
3. **Документирайте всяко съществено действие**
4. **Проверявайте преди изменение и плащане**
5. **Планирайте приключването и устойчивостта**

„Всяко решение трябва да има основание, всяко действие — отговорник, а всеки отчетен резултат — доказателство.“

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



Благодарим ви за участието!

Възложител

СНЦ „Местна инициативна група – Медковец - Монтана“

www.mig-mm.com

office@mig-mm.com

Изпълнител

„Грантит“ ЕООД

Биляна Качамачкова

www.grantit.bg

office@grantit.bg

Grant it
EU Projects and Management

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.
