Съфинансирано от Европейския съюз

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027
за развитие на земеделието и селските райони

МИГ Медковец - Монтана

Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ – 28.10.2026 г.

От проектната идея до успешното проектно предложение

подготовка и разработване на проекти

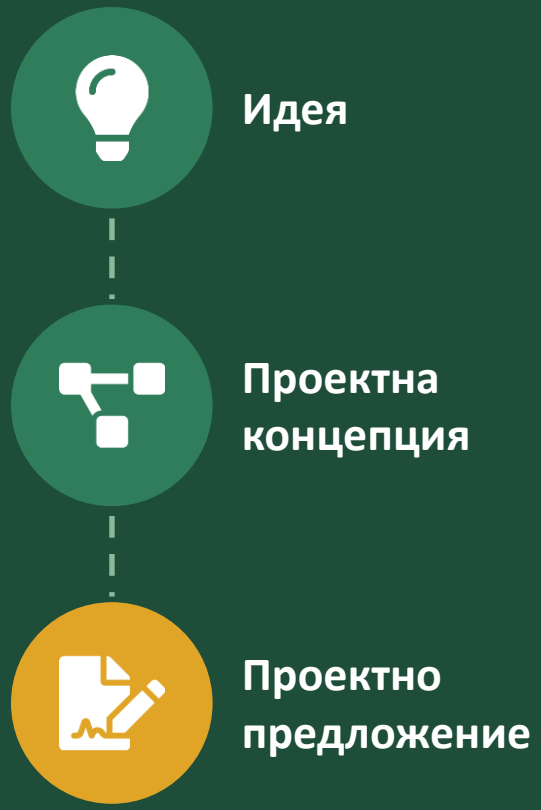

Възложител

СНЦ „Местна инициативна група – Медковец - Монтана“

Изпълнител

„Грантит“ ЕООД

Място на провеждане - с. Медковец / зала на ОбС

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Grant it
EU Projects and Management

Какво ще научим днес?

1

От местния проблем до проектната идея

ВЪВЕДЕНИЕ И МОДУЛ 1

Проблем, причини, последствия, целеви групи

2

От целите до дейностите и резултатите

МОДУЛ 2

Цели, дейности, резултати, индикатори

3

От ресурсите до бюджета

МОДУЛИ 3 И 4

Задачи, график, ресурси, разходи

4

От готовото предложение до подготовката за подаване

МОДУЛИ 5 И 6

Качество, документи, ИСУН 2020

Регистрация · Въведение · Модул 1 · Модул 2 · Модул 3 · Модул 4 · Модул 5 · Модул 6 · Работилница · Закриване

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Какво представлява проектът?

> *Проектът е ограничена във времето съвкупност от взаимно свързани дейности, чрез които се стремим да постигнем конкретна цел и измерими резултати с определени ресурси.*

Конкретен проблем и цел

Какъв проблем решаваме, за кого и каква промяна искаме да постигнем?

Взаимосвързани дейности

Какво трябва да направим — дейности, логически свързани с целта

Ограничено време и ресурси

Колко време и какви ресурси ще са ни необходими?

Измерими резултати

Как ще докажем, че сме постигнали резултат?

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Какво е МИГ и каква е ролята на Стратегията?

> *„Местна инициативна група“ обединява представители на различни местни интереси и участва в прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ чрез разработена Стратегия.*

Стратегията за ВОМР на МИГ Медковец- Монтана

Тя очертава местните приоритети, мерките и основните параметри на подкрепата.

Конкретната процедура за кандидатстване

Съдържа окончателните изисквания за кандидатите, дейностите, разходите, документите, оценяването и подаването.

Проектното предложение

Конкретният отговор на кандидата: какво иска да направи, защо, с какви ресурси и какъв резултат очаква.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

МИГ Медковец–Монтана и Стратегията за ВОМР

Роля на местната инициативна група

Обединява представители на различни местни интереси и прилага подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)

Местни потребности и приоритети

Имат водещо значение при планирането. Но не всеки местен проблем може да бъде финансиран — рамката се определя от стратегията

Стратегия, процедура и проектно предложение

Стратегия за ВОМР
В какви направления е предвидена подкрепа

Процедура за кандидатстване
При какви конкретни условия може да се кандидатства

Проектно предложение
Как кандидатът ще използва възможността, за да постигне резултат

Предварителна подготовка и бъдеща допустимост: процедурите на МИГ все още не са обявени. Днес подготвяме идеята и проверяваме предварително съответствие със стратегията; допустимостта се потвърждава само по официалните условия.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

СВОМР НА МИГ МЕДКОВЕЦ–МОНТАНА · РЕЗЮМЕ

Стратегията накратко: 11 мерки за развитие на територията

6 мерки по ЕЗФРСР
≈ 2 297 620 €
Мерки 1–6

5 мерки с допълващо финансиране
≈ 836 678 € *
Мерки от· ПРЧР · „Образование“ · „Околна среда“

** Сборът на бюджетите е приблизителен след превалутирането*

Основни направления

- Земеделие
- Местен бизнес
- Инфраструктура и интелигентни селища
- Културно наследство
- Заетост
- Образование
- Околна среда

Три различни стойности — не са едно и също

1 Бюджет на мярката
Общият ресурс за всички проекти по мярката

2 Мин. и макс. допустими разходи
Рамката за размера на един проект

3 Максимална БФП
Най-голямата безвъзмездна помощ за един проект

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Проблем, потребност, възможност и проектна идея

Проблем

Какво не е наред?

Съществуващо нежелано състояние

Пример: Група жители има затруднен достъп до обществена услуга

Потребност

Каква промяна е необходима?

Необходимата промяна

Пример: Подобряване на достъпа до тази услуга

Възможност

Какви възможности съществуват?

Потенциален ресурс или механизъм за промяната

Пример: Мярка в стратегията — ако конкретните условия го позволяват

Проектна идея

Какво решение предлагаме?

Нашето предложение как да постигнем промяната

Пример: По-достъпна организация за предоставяне на услугата

Проблемът не е „Нямаме микробус“, а „Хората в определени населени места имат затруднен достъп до услуга“. Добрият проект започва с въпроса „Какво трябва да променим?“, а не „Какво можем да купим?“.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Откъде започва един добър проект?

Започваме от решението

„Искаме да направим туристически маршрут.“

Не знаем защо е необходим, кого ще обслужва, какво ще промени и дали може да се поддържа.

Започваме от проблема

„Информацията за определени местни културни и природни ресурси е трудно достъпна за потенциалните посетители.“

Пример, но може да проверите приложението му на територията на МИГ.

Проблемът преди решението

Първо питаме: какъв проблем искаме да решим?

Защо не започваме с покупката?

Рискуваме проект около предварително избрана дейност

Реална местна потребност

Всяко съществено твърдение трябва да бъде проверено

Обосновка на проектната идея

Проектът е обоснован опит да променим конкретно нежелано състояние

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Как формулираме и доказваме проблема?

1 Кой е засегнат?

Възрастни хора, младежи, местни производители, организации, ползватели на услуга

2 Как знаем, че проблемът съществува?

Данни, документи, наблюдения, проучвания, обратна връзка

3 Какви са причините?

Без тях рискуваме решение, което не води до желаната промяна

4 Какви са последствията?

Какво ще се случи, ако не предприемем нищо?

Източници на доказателства

- Статистически данни
- Общински документи
- Налични анализи
- Данни на организацията
- Анкети и интервюта
- Консултации с потребители

Стратегията за ВОМР дава контекст, но не заменя обосновката на конкретния проект.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Дърво на проблемите

Последствия — корона

Какво се случва в резултат на проблема?

Основен проблем — ствол

Кое е нежеланото състояние?

Причини — корени



Логическа връзка между трите нива

Защо проблемът е важен?

Защо съществува проблемът?

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

От проблема към потребността

Нежелано състояние	Необходима промяна	Възможни решения	Избор на реалистичен подход
ПРИМЕР *„Информацията за определени местни културни ресурси е трудно достъпна.“*	ПРИМЕР *„Необходимо е подобряване на достъпността и систематизирането на информацията.“*	ПРИМЕР • Общ информационен ресурс • Дигитално съдържание • Информационни материали • Сътрудничество между организации • Представяния пред аудитории	ПРИМЕР • Адресира установените причини • Реалистичен за кандидата • Води до измерими резултати • Може да се впише в подходяща бъдеща процедура

Една потребност може да има няколко решения — избираме обосновано.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Целеви групи и заинтересовани страни

Кой изпитва проблема?

Хората или организациите, засегнати от нежеланото състояние

За кого е предназначен проектът?

Целева група — при нея очакваме резултат или промяна

Кой може да съдейства?

Заинтересовани страни — подпомагат, засегнати са или имат интерес

Кой може да бъде допустим кандидат?

Определя се от мярката, условията на процедурата и нормативните правила

Целева група ≠ допустим кандидат

Учебен пример: кой каква роля има?

Участник	Възможна роля
Потенциални посетители	Ползватели на информацията
Местно читалище	Източник на информация или участник в дейности
Община или кметство	Институционална координация според проекта
Местен бизнес	Заинтересована страна или ползвател на резултатите
Кандидатстваща организация	Подготвя и изпълнява проекта, ако е допустим кандидат

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

От дърво на проблемите към дърво на целите

АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА	ЖЕЛАНО СЪСТОЯНИЕ
Информацията е разпокъсана	**Информацията е систематизирана**
Информацията е трудна за използване	**Информацията е представена в достъпен формат**
Организациите обменят ограничено информация	**Подобрена координация между организациите**
Посетителите трудно намират необходимата информация	**Подобрен достъп на посетителите до информация**

От нежелано към желано състояние

Проблемът описва настоящето, целта — желаната промяна

Преобразуване на причините

Всяка причина се превръща в положително състояние

Избор на реалистична промяна

Въздействаме върху причините, за които можем да поемем отговорност

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Обща и специфична цел

ОБЩАТА ЦЕЛ — ПО-ШИРОК ПРИНОС

По-широката положителна промяна, за която проектът „допринася“

„Допринасяне за по-доброто представяне и устойчивото използване на местното културно наследство като ресурс за развитие.“

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ — КОНКРЕТНА ПРОМЯНА

Конкретната промяна, която очакваме чрез нашия проект

„Подобряване на достъпа на потенциалните посетители до систематизирана информация за подбрани местни културни ресурси.“

Цел и дейност — каква е разликата?

✗ *„Целта на проекта е закупуване на оборудване.“*

✓ *„Подобряване на условията за предоставяне на определена услуга.“*

Проверка на формулировката

- ☑ Ясно ли е каква промяна се очаква?
- ☑ За кого или за какво се отнася?
- ☑ Може ли проектът реалистично да допринесе?
- ☑ Как ще установим дали е настъпила?

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

От целите към проектните дейности

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

Подобряване на достъпа до систематизирана информация за подбрани местни културни ресурси

ДЕЙНОСТ 1

Проучване и систематизиране на информацията

Ако я премахнем? Без проучване — няма достоверна информация

ДЕЙНОСТ 2

Разработване на информационен продукт

Ако я премахнем? Без продукт — нищо не предоставяме на потребителите

ДЕЙНОСТ 3

Представяне и популяризиране на продукта

Ако я премахнем? Без популяризиране — хората не научават за създаденото

1 Какво трябва да направим?

Дейност = съвкупност от действия за определен резултат

2 Как дейността допринася за целта?

Ако не можем да обясним връзката — дейността е под въпрос

3 Необходими и излишни дейности

Не добавяме дейности механично

4 Проверка на логическата връзка

Тест: какво се променя, ако премахнем дейността?

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Дейност, непосредствен резултат и очаквана промяна

Дейност	Непосредствен резултат	Очаквана промяна
Какво правим?	*Какво създаваме?*	*Какво ще бъде по-добре?*

ПРИМЕРИ ОТ УЧЕБНИЯ КАЗУС

Проучване на местни ресурси	Подготвена систематизирана информация	**По-добра информационна основа**
Разработване на информационен продукт	Създаден информационен продукт	**По-лесен достъп до информация**
Провеждане на информационни събития	Проведени събития	**Подобрена информираност на целевата аудитория**
Организиране на обучение	Проведено обучение	**Повишени знания или умения на участниците**

Присъственият списък доказва проведено обучение, но не и придобити знания — промяната се установява с тест или задача.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Индикатори и доказателства

Учебен пример

Учебни стойности

Резултат	Примерен индикатор	Целева стойност
Създаден информационен продукт	Брой разработени продукти	**1**
Проведени информационни събития	Брой проведени събития	**3**
Включени участници	Брой участници	**60**
Подготвена систематизирана информация	Брой обхванати обекти	**10**

Индикаторът има целева стойност и ясен начин за проверка.

Какво измерваме?

Изпълнение, резултат или определена промяна

Количествени и качествени характеристики

Брой продукти, събития, участници — и промяна, установена с подходящ метод

Реалистични стойности

Не обещаваме повече, отколкото можем да измерим

Как доказваме резултата?

Продукт, програми, списъци и др. — според процедурата и договора

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Проектната концепция в една схема



Проблем	Потребност	Цел	Дейности	Резултати	Индикатори и доказателства
Информацията е трудно достъпна	Систематизирана и достъпна информация	Подобрен достъп до информация за подбрани ресурси	Проучване · продукт · представяне	Създаден продукт, проведени събития	Брой продукти, събития, участници; продукт, програми, списъци

Проверка в двете посоки: всеки елемент трябва да произтича от предходния и да води към следващия

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Как превръщаме проектната концепция в изпълним план?

Основни дейности
Какво ще направим?

Конкретни задачи
На какво ще го разделим?

Последователност
В какъв ред?

Необходими ресурси
С какво?

Пример: „Разработване на информационен продукт за местни културни ресурси“ — 8 задачи

1. Определяне на съдържанието
2. Събиране на информация
3. Проверка на достоверност и права
4. Подготовка на съдържание
5. Разработване на продукта
6. Тестване с потребители
7. Корекции
8. Приемане на продукта

Важно: разбиваме дейността до ниво, на което можем да определим отговорник, срок, необходим ресурс и проверим резултат.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Последователност и взаимозависимост на задачите/дейностите

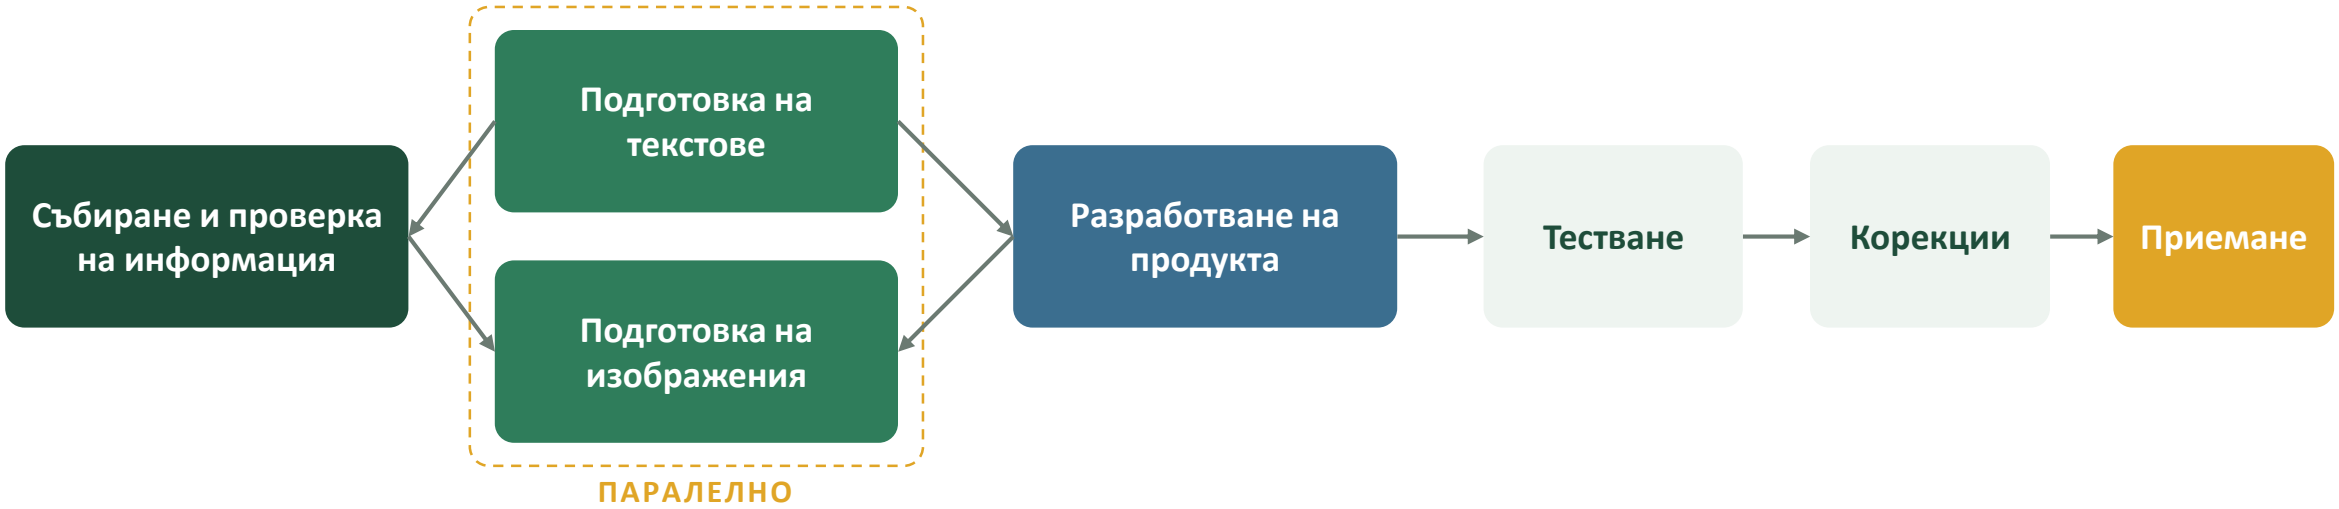

Коя дейност започва първа?

Каквото трябва да приключи преди следващата

Кои дейности зависят една от друга?

Не приемаме продукт, преди да е разработен и проверен

Кои могат да се изпълняват паралелно?

Текстове и изображения — при налична информация

Какво може да доведе до забавяне?

Закъсняла информация от партньор забавя цялата верига

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Необходими ресурси

Човешки ресурси

Ръководител, екип, експерти, външни изпълнители, партньори, доброволци — когато е подходящо и допустимо

Материали и оборудване

Помещения, техника, материали. Наличен ресурс, наем или услуга — изборът се обосновава

Външни услуги

Дигитален продукт, дизайн, печат, експертни услуги + избор на изпълнител, договор, контрол, приемане

Организационен капацитет

Разполага ли организацията с необходимите хора, знания и време?

Връзка с бюджета

Дейност

↓

Задача

↓

Необходим ресурс

↓

Разход

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Роли и отговорности

Кой изпълнява?
Хората, които извършват задачата

Кой координира?
Следи срока и връзката между задачите

Кой проверява?
Тестване и проверка спрямо изискванията

Кой носи отговорност за резултата?
Оправомощено лице приема резултата

Учебно разпределение на ролите

Задача	Необходим ресурс	Отговорник	Резултат
Събиране на информация	Експертно време, източници	Координатор съдържание	Събрани материали
Подготовка на текстове	Авторско и редакторско време	Определен експерт	Готови текстове
Разработване на продукта	Технически капацитет или външна услуга	Отговорник по дейността	Работен продукт
Тестване	Участници, време, обратна връзка	Координатор	Установени забележки
Приемане	Проверка спрямо изискванията	Оправомощено лице	Приет резултат

Чест риск: един човек или една организация с твърде много задачи за кратко време. Проверяваме реалния капацитет на отговорника.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Реалистични срокове и график

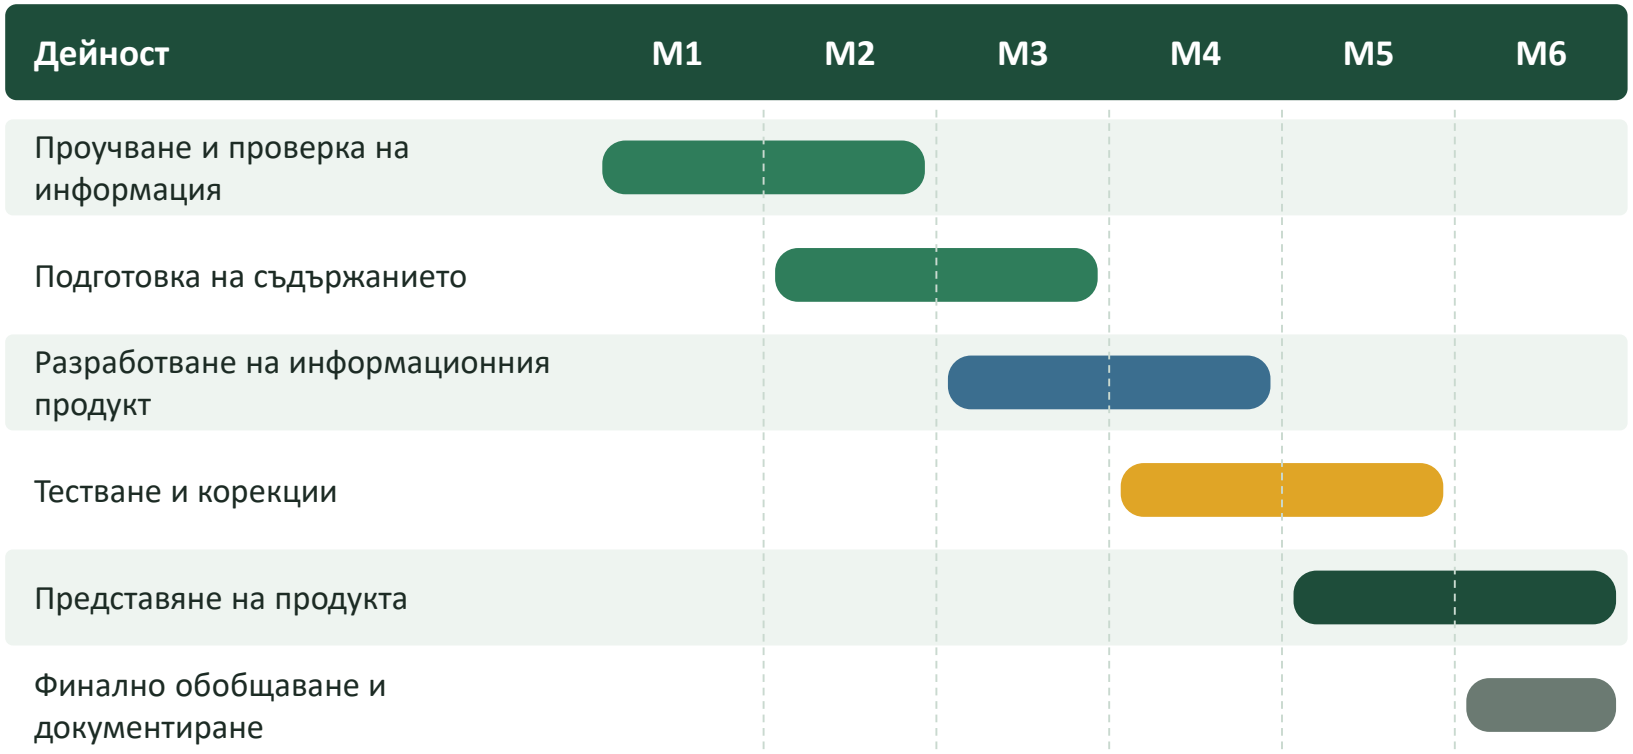

Учебна продължителност 6 месеца

Продължителност на дейностите
Включва ли всички задачи?

Начало и край
Зависи ли от друга задача?

Междинни етапи
Време за тестване и корекции

Времеви резерв
Разумен резерв за забавяния

Контролни точки
Проверка, приемане, отстраняване на недостатъци

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Бюджетът следва дейностите

Дейност	Необходим ресурс	Вид разход	Количество	Стойност
Разработване на информационен продукт	Дизайн и техническа разработка	Външна услуга, ако е необходима	1 услуга	1 200 € (учебна стойност)

> **Не измисляме дейности, за да усвоим бюджет. Определяме бюджет, за да изпълним необходимите дейности.**

Не всеки използван ресурс е нов разход: собствено помещение или налична техника може да не изискват разход. Необходим разход ≠ допустим разход.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Основни принципи при бюджетиране

1

Необходимост

Разходът е свързан с конкретна дейност и действително е необходим

2

Обоснованост

Ясна връзка между разход, задача, количество и резултат

3

Реалистичност

Количества от реалния обхват; цени от обоснована информация

4

Ефективност

Използваме наличните ресурси и избягваме припокриване

5

Съответствие с проекта

Бюджетът разказва същата история като целите и дейностите

Добрият бюджет е този, при който можем да обясним всяка позиция — логичен, реалистичен, обоснован и съобразен с правилата.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Как определяме разходите?

Количество 100 бр. × **Единична цена** 2 € = **Обща стойност** 200 €

1. **Какво е необходимо?**
   Позиция, свързана с конкретна задача
2. **В какво количество?**
   Произтича от реалния обхват на дейността
3. **Как се определя ориентировъчната стойност?**
   Пазарна информация или ценови проучвания
4. **Как обосноваваме избора?**
   Какво точно включва „1 услуга“?

Учебен бюджет — примерни стойности

Примерна бюджетна позиция	Количество	Ед. цена	Общо
Подготовка и редакция на съдържание	1 услуга	600 €	600 €
Дизайн и техническа разработка	1 услуга	1 200 €	1 200 €
Подготовка на изображения	1 услуга	300 €	300 €
Печат на информационни материали	100 бр.	2 €	200 €
Общо			**2 300 €**

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Проверка на проектния бюджет - обосновка

Съответствие с дейностите
Всеки разход е свързан с конкретна дейност

Връзка с очакваните резултати
Разходът допринася за планирания резултат

Аритметична точност
Количество × единична цена = обща стойност

Обоснованост на стойностите
Ясно как е определена цената; без припокриване

Проверка по бъдещите условия
Допустимост, ограничения, размер на помощта

Общ бюджет ≠ размер на помощта

Илюстративен пример

10 000 € Допустими разходи

8 000 € Помощ при хипотетични 80%

2 000 € Собствен дял

Размерът на помощта и собственият принос зависят от конкретната мярка.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Чести грешки при бюджетиране

ГРЕШКА	КАК ИЗГЛЕЖДА	КАК ДА Я ИЗБЕГНЕМ
Разход без ясна дейност	*Позиция, която не може да се свърже с конкретна задача*	Свържете позицията с дейност или преценете дали е необходима
Необоснована стойност	*„Услуга — 2 000 евро“ без описание; дублиране между позиции*	Опишете обхвата и как е определена цената
Пропуснат необходим ресурс	*Дейност, за която не са предвидени ресурси*	Проверете всяка задача: с какво ще бъде изпълнена?
Несъответствие с графика	*Променена дейност без актуализиран график и бюджет*	Съгласувайте дейности, срокове и разходи
Предположения за допустимост	*„Полезен е, значи ще бъде финансиран“*	Проверете по окончателните условия; не преименувайте разхода

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Какво прави проектното предложение качествено?

Ясен проблем

Конкретен и обоснован

Обоснована необходимост

Подкрепена с проверими данни

Реалистична цел

Описва желаната промяна

Логически свързани дейности

Всяка допринася за целта

Проверими резултати

Измерими и доказуеми

От проблема към резултатите

Можем ли да обясним всяка следваща стъпка?

От бюджета назад

Можем ли да обясним защо е необходим всеки разход?

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Обосновка на необходимостта от проекта

1. **Местен контекст**
   Стратегията за ВОМР — контекст и приоритети
2. **Доказателства за проблема**
   Проверими данни, а не общи твърдения
3. **Засегнати групи**
   Кои хора или организации и в кои места
4. **Предложено решение**
   Защо точно тази интервенция е необходима
5. **Очаквана полза**
   Каква промяна ще настъпи — и за кого

✖ ***„На територията има необходимост от развитие на туризма.“***

Твърде общо — не доказва потребност.

Елемент	Какво означава
Факт	Проверима информация за съществуващо състояние
Извод	Какво показва тази информация
Потребност	Каква промяна е необходима
Проектно решение	Как предлагаме да постигнем промяната

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Съгласуваност между частите на предложението

Проблем ⟷ **Цел** ⟷ **Дейности** ⟷ **Резултати** ⟷ **Индикатори**

Проблем и цел

Целта променя ли описания проблем?

Цел и дейности

Всяка дейност подпомага ли целта?

Дейности и резултати

Всяка дейност има ли резултат?

Резултати и индикатори

Можем ли да измерим и докажем?

Дейности, график и бюджет

Бюджетът разказва ли същата история? Има ли дейности без ресурси или разходи без дейност? Една промяна в проекта може да изисква промяна в няколко документа.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Как обосноваваме избрания подход?

Защо точно тези дейности?

Всяка подпомага цел; не добавяме дейности, за да изглежда проектът по-голям

Защо тези целеви групи?

Ясно обяснение защо групата е свързана с проекта

Защо този график?

Реалистични срокове, зависимости и резерв

Защо тези ресурси?

Произтичат от задачите; съобразени с капацитета и финансите

Как ще използваме резултатите?

Кой ще поддържа продукта, ще използва оборудването, ще осигури услугата след проекта?

По-големият бюджет на проекта не е автоматично по-добрият проект.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Чести слабости в проектните предложения

СЛАБОСТ	СЛАБ ПРИМЕР	ПО-ДОБРЕ
1 **Общи твърдения без доказателства**	*„Местният туризъм е слабо развит.“*	✓ Конкретен проблем, засегнати групи и проверими данни
2 **Цел, формулирана като покупка**	*„Целта е закупуване на оборудване.“*	✓ „Подобряване на условията за предоставяне на определена услуга.“
3 **Несвързани дейности**	*Покупка на техника без обяснение как подобрява достъпа*	✓ Всяка дейност има ясна връзка с целта
4 **Неизмерими резултати**	*„Подобрено развитие на туризма.“*	✓ Показател, целева стойност и начин на проверка
5 **Нереалистичен бюджет или график**	*Бюджет само като обща сума; продукт „за един месец“*	✓ Позиции с количества и цени; време за тестване, корекции и резерв

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Финална самопроверка на проектната идея

Ясна ли е потребността?
Конкретен проблем, подкрепен с данни

Логична ли е интервенцията?
Цел, дейности и резултати са свързани

Изпълним ли е планът?
Време, капацитет, финанси, резултати

Обоснован ли е бюджетът?
Всяка позиция може да бъде обяснена

Какво предстои да проверим по процедурата?
Само по официалните условия

Какво можем да направим сега?	Какво проверяваме при обявена процедура?
Да разработим и обосновем идеята	Окончателните изисквания за допустимост
Да потърсим подходяща мярка в стратегията	Точните условия на конкретния прием
Да определим предварителни дейности и резултати	Допустимите дейности и официалните индикатори
Да подготвим ориентировъчен бюджет	Допустимите разходи, ограниченията и размера на помощта
Да съберем данни за организацията и потребността	Изискваните документи и декларации
Да направим предварителна самооценка	Официалните критерии и методиката за оценка

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Кога проектната идея е готова за кандидатстване?

Добре разработеният проект не означава автоматично проект, готов за подаване.

1. Разработена проектна концепция
2. Проверена допустимост
3. Съобразяване с конкретната процедура
4. Подготвено проектно предложение

1. Добър ли е проектът? Логика, обоснованост, реалистичност

2. Отговаря ли на процедурата? Допустимост и всички условия

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Подготовка на документите

Условия за кандидатстване

Започваме от официалната документация, не по памет

Формуляр

Работим с формуляра на конкретния прием

Изискуеми приложения

Само изискуемите за нашия кандидат и проект

Съгласуваност на информацията

Еднакви стойности, срокове и дейности навсякъде

Проверка на актуалните образци

Официални разяснения и изменения; без стари образци

Матрица на документите

Вътрешна контролна таблица — попълва се по конкретната процедура

Документ (според процедурата)	Изисква се?	Отговорник	Готов?	Проверен?
Документ А	За проверка			
Документ Б	За проверка			
Документ В	За проверка			
Документ Г	За проверка			

Подпис · формат · окончателна версия — отбелязват се за всеки документ

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Електронно кандидатстване чрез ИСУН 2020

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Избор на правилната процедура

Наименование, идентификация, обхват, актуални условия

Достъп и права

Кой има право да подпише и подаде; изисквания за електронен подпис

Работа с електронния формуляр

Кандидат, проект, цели, дейности, резултати, индикатори, бюджет

Подготовка на приложенията

По матрицата: правилен, актуален, по изисквания начин

Проверка преди подаване

Системни проверки + собствена финална проверка

Методическо уточнение: разглеждаме общата последователност — не реален прием на МИГ Медковец–Монтана; не въвеждаме и не подаваме действителни данни. Автоматичната проверка не заменя човешката.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Проверка на формуляра за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване — проверка по раздели

Данни за кандидата	Актуални и проверени; съответстват на приложените документи
Описание на проекта	Отговаря на въпросите във формуляра — без механично копиране
Цели и дейности	Съответстват на графика, бюджета и приложенията
Резултати и индикатори	Изискуемите индикатори, определения и правила за отчитане
График и бюджет	Съответстват на окончателния бюджет; количества, суми, ограничения

Къде може да се появи несъответствие?

Сравняваме	Къде
Наименование	Формуляр и приложения
Данни за кандидата	Формуляр, декларации
Дейности	Формуляр, график, бюджет
Срокове	Описание и график
Бюджетни стойности	Формуляр, таблици, обосновки
Версия на документ	Образец и окончателен файл

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Прикачване и проверка на документите

Необходими приложения

Според матрицата на документите

Актуални версии

Окончателната версия по актуалния образец

Правилен файл

Чете се ясно, всички страници, попълнени полета

Съответствие с изискванията

Подписи, когато се изискват; спазен формат

Пълнота на комплекта

Нищо не липсва спрямо изискванията

Ясни имена на файловете

`01_Описание_проект`

`02_Бюджет`

`03_Приложение_съгласно_процедурата`

Рискови имена

~~`final`~~

~~`final2`~~

~~`posledna_versia_final`~~

Приме

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Последни проверки преди електронно подаване

Правилна процедура
Работим по правилния прием и актуалните условия

Попълнена информация
Всички задължителни части; съгласувани данни

Приложени документи
Комплектът е пълен, актуален и проверен

Права за подаване
Право на подпис и технически изисквания — проверени рано

Действителен краен срок
Проверен в официалната документация

Автоматичната проверка не заменя човешката проверка.

Крайният срок е срок за подаване, а не момент, в който тепърва започваме проверките.

След подаването

- Статус и потвърждение
- Съхраняване на информацията
- Официална комуникация и срокове

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Чести грешки при електронното кандидатстване

Неправилна процедура	Стар или случайно намерен формуляр
Непълни данни	Непопълнени полета; разминавания между частите
Липсващ или грешен файл	Стара версия, неподходящ образец
Непроверени права	Подписът и подаването не са проверени рано
Запазен, но неподаден формуляр	„Запазено“ не означава непременно „подадено“

Учебна ситуация: 40 минути до крайния срок

- Формуляр: 49 800 € — приложение: 47 500 €
- Документ по стара версия на образеца
- Дейност променена, графикът — не
- Системата не показва техническа пречка

Ще подадете ли веднага?

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

БОНУС · ТЕМА 1 · ПРИЛОЖЕНИЕ НА AI

AI при подготовката на проектно предложение — къде помага

МОДУЛ 1 · ПРОБЛЕМ

Анализ на проблема

Структурира данни от анкети и срещи; предлага чернова на проблемно дърво — причини и последици.

Проверявате: реални ли са данните и източниците

МОДУЛ 2 · ЦЕЛИ

Цели, дейности, резултати

Предлага чернова на логическа връзка проблем → цел → дейност → резултат → индикатор.

Проверявате: реалистични и измерими ли са

МОДУЛ 3 · ПЛАН

График и рискове

Подрежда дейностите във времето, открива зависимости и предлага регистър на рисковете.

Проверявате: капацитета и сроковете на екипа

МОДУЛ 4 · БЮДЖЕТ

Проверка на бюджета

Проверява аритметиката и връзката „дейност — разход“; открива разходи без дейност.

Проверявате: цените — само от реални оферти

МОДУЛ 5 · ТЕКСТ

Яснота на текста

Съкращава, изяснява и сверява текста с поставените от вас критерии за оценка.

Проверявате: смисълът да не се е променил

МОДУЛ 6 · ПОДАВАНЕ

Контролен списък

От указанията, които му подадете, изготвя списък на изискуемите документи и полета.

Проверявате: по официалните указания на процедурата

AI предлага черновата — кандидатът проверява фактите, преценява реалистичността и носи отговорност за предложението.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Съфинансирано от Европейския съюз
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 2023-2027 за развитие на земеделието и селските райони
МИГ Медковец - Монтана
Европейски земеделски фонд за развитие на селски райони

AI при подготовката на проектно предложение — как да питаме

Примерни заявки към AI асистент (учебни)

ПРОБЛЕМНО ДЪРВО

„Ето обобщените отговори от анкета сред 40 жители и бележките от срещата с общността. Предложи проблемно дърво — основен проблем, причини и последици. Не добавяй информация, която я няма в текста.“

Резултат: структурирана чернова за обсъждане с екипа

КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТА

„Ето целите, дейностите и резултатите ни. Провери дали всяка дейност води до резултат и дали всеки резултат има измерим индикатор. Посочи пропуските в таблица.“

Резултат: списък с липсващи връзки и неясни индикатори

БЮДЖЕТ

„Ето бюджета по дейности. Провери сборовете и посочи разходи, които не са свързани с конкретна дейност. Не предлагай цени.“

Резултат: аритметична проверка и несъответствия

Граници и правила

- **Не измисля данни.** Статистика и цифри — само от проверими източници.
- **Не знае условията.** Изискванията на процедурата се четат от официалните документи.
- **Без лични данни.** Не въвеждаме лични данни на жители и участници.
- **Текстът остава ваш.** Оценява се реалната местна идея, не стилът.
- **Човекът решава.** Кандидатът носи отговорност за всяко твърдение.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ·

От проектната идея до проектното предложение

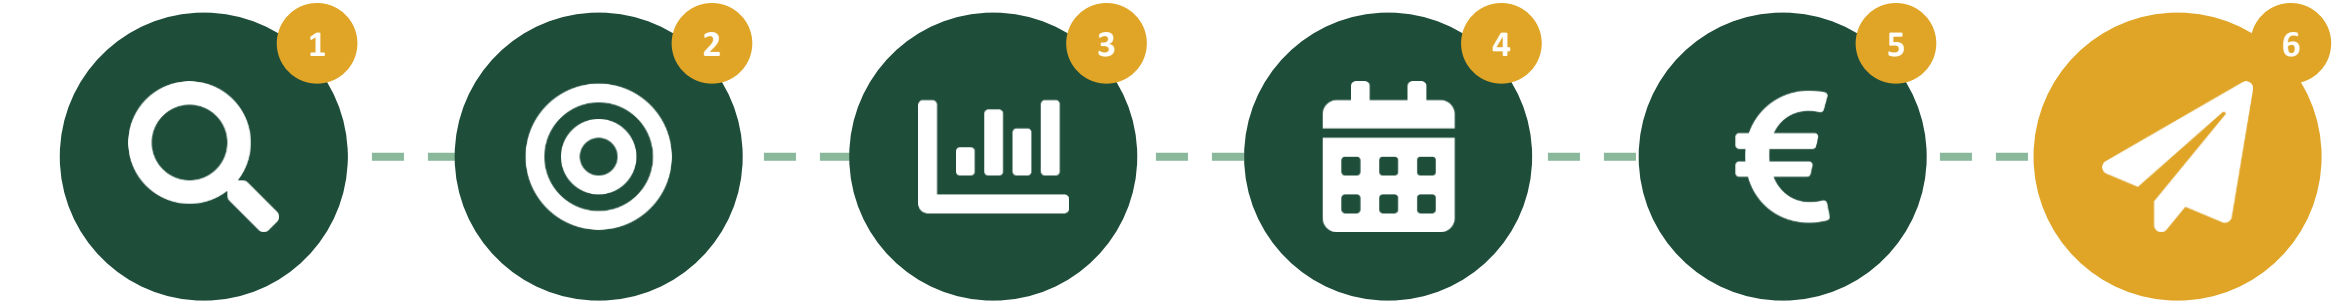

1	2	3	4	5	6
Проблем и потребност	Цели и дейности	Резултати и индикатори	Ресурси и график	Бюджет	Проверка и подготовка за подаване
МОДУЛ 1	МОДУЛ 2	МОДУЛ 2	МОДУЛ 3	МОДУЛ 4	МОДУЛИ 5 И 6

Качественият проект започва от реална потребност и се изгражда чрез последователни, обосновани и изпълними решения.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ·

Пет въпроса преди кандидатстване

1

Какъв проблем решаваме?

Реална, обоснована потребност

2

За кого?

Ясно определени целеви групи

3

Какво ще направим?

Дейности, свързани с целта

4

Как ще измерим резултата?

Индикатори и доказателства

5

Съответстваме ли на конкретните условия?

Проверка по официалната процедура

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ·

Какво следва след обучението?

СЕГА — ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРИ ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА

Доработване на проектната идея	Събиране на доказателства	Предварителна проверка спрямо Стратегията за ВОМР	Проследяване на официалните процедури	Подготовка за кандидатстване при публикувани условия

Подготвяйте съдържанието отсега. Проверявайте правилата при конкретния прием.

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.



Благодарим ви за участието!

Възложител

СНЦ „Местна инициативна група – Медковец - Монтана“

www.mig-mm.com

office@mig-mm.com

Изпълнител

„Грантит“ ЕООД

Биляна Качамачкова

www.grantit.bg

office@grantit.bg

Grant it
EU Projects and Management

Тази презентация е изготвена в изпълнение на Административен договор № РД 50-160/03.02.2026 г. Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-93/28.01.2026 г. на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА“, финансиран от СПРЗСР 2023-2027 г., съ-финансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.
